


Selvimplementering

Beskrivelse af ”Fuld selvimplementering” og ”Light selvimplementering”

December 2025



Udrulningsplanen i bølger

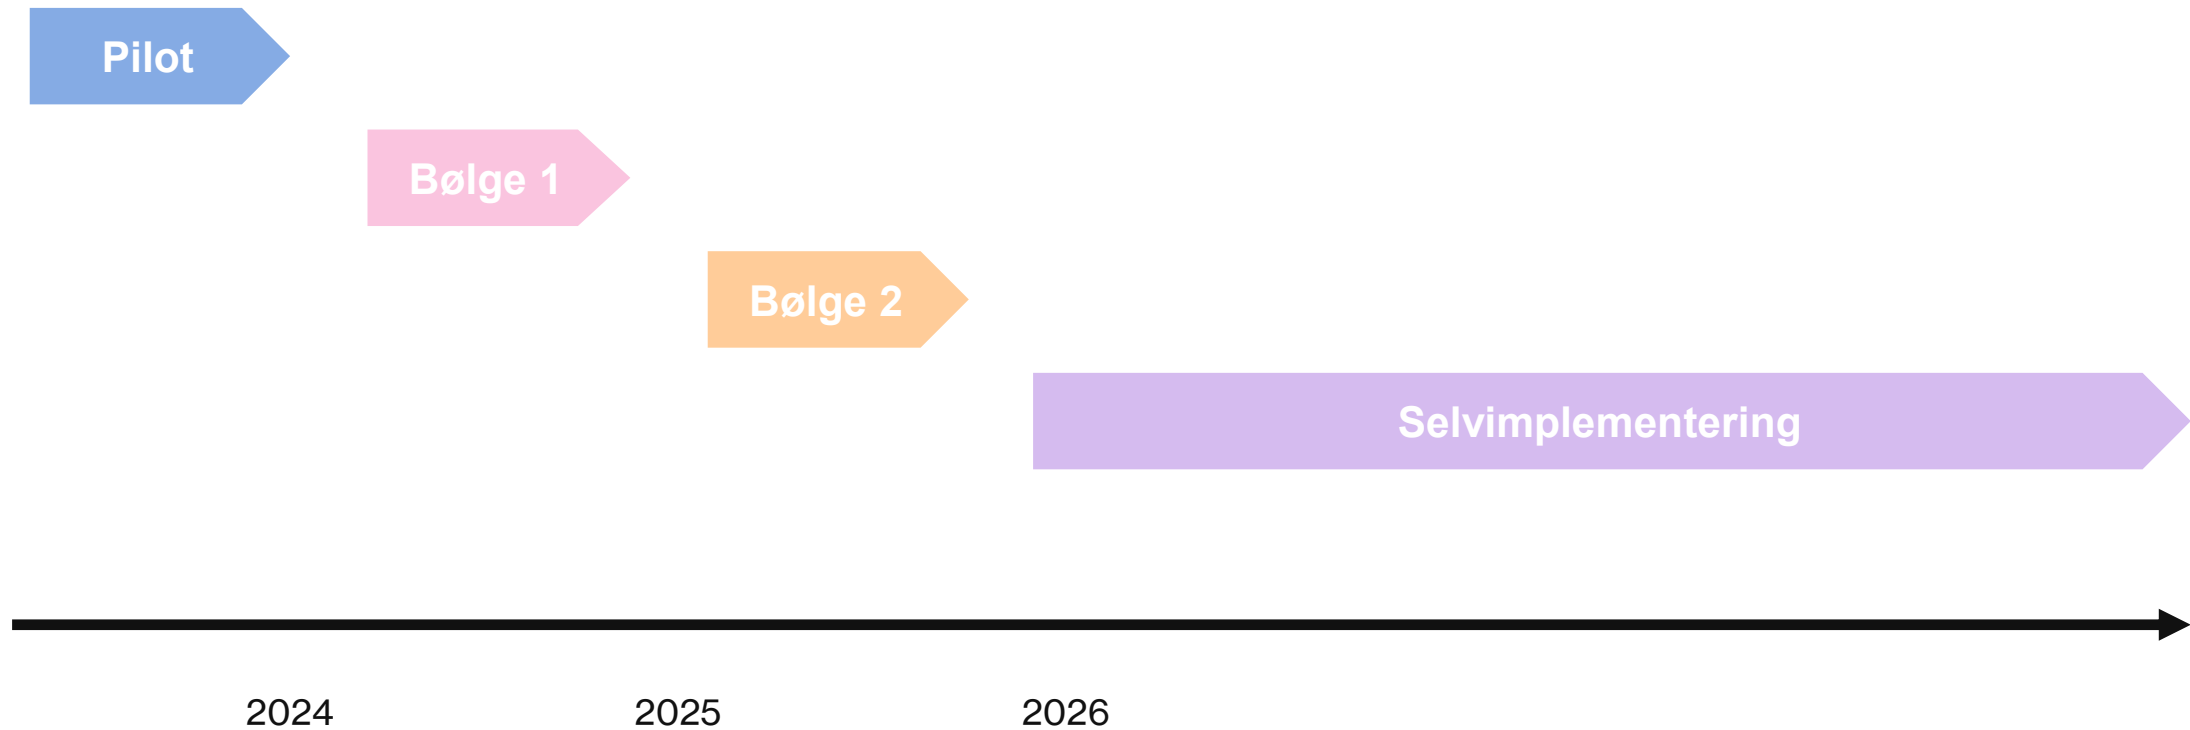


”Fuld selvimplementering” eller ”Light selvimplementering”?

- Fuld selvimplementering
 - ”Hands-on” kendskab til alle funktioner i løsningen
 - Adgang til at arbejde i brugertestmiljøet, og evt. afprøve ny funktionalitet dér, inden det tages i brug i produktion
- Light selvimplementering
 - Hurtigere ibrugtagning af løsningen i produktion
 - Kan være en fordel at gennemføre ”Light selvimplementering”, hvis din kommune ikke har mulighed for at sætte et miljø op i Extest



Overordnet tidsplan – ”Fuld selvimplementering”

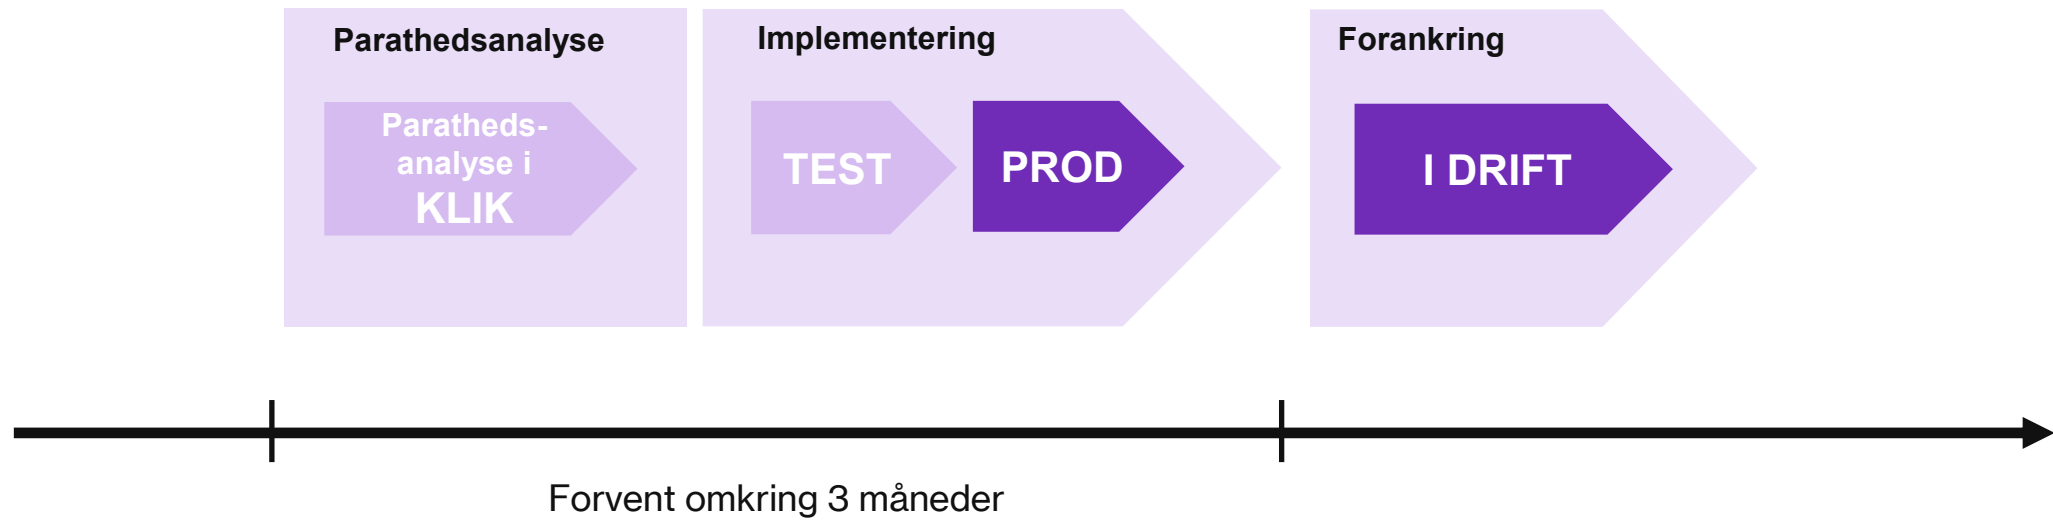

Tidsplan foldet ud på faser

Parathedanalyse (PA)

Forberedelse af infrastruktur (IN)

Forberedelse Test (FT)

Forberedelse Produktion (FP)

Produktion (PR)


Go-live



Udfoldet tidsplan for "Fuld selvimplementering"



Overordnet tidsplan – ”Light selvimplementering”

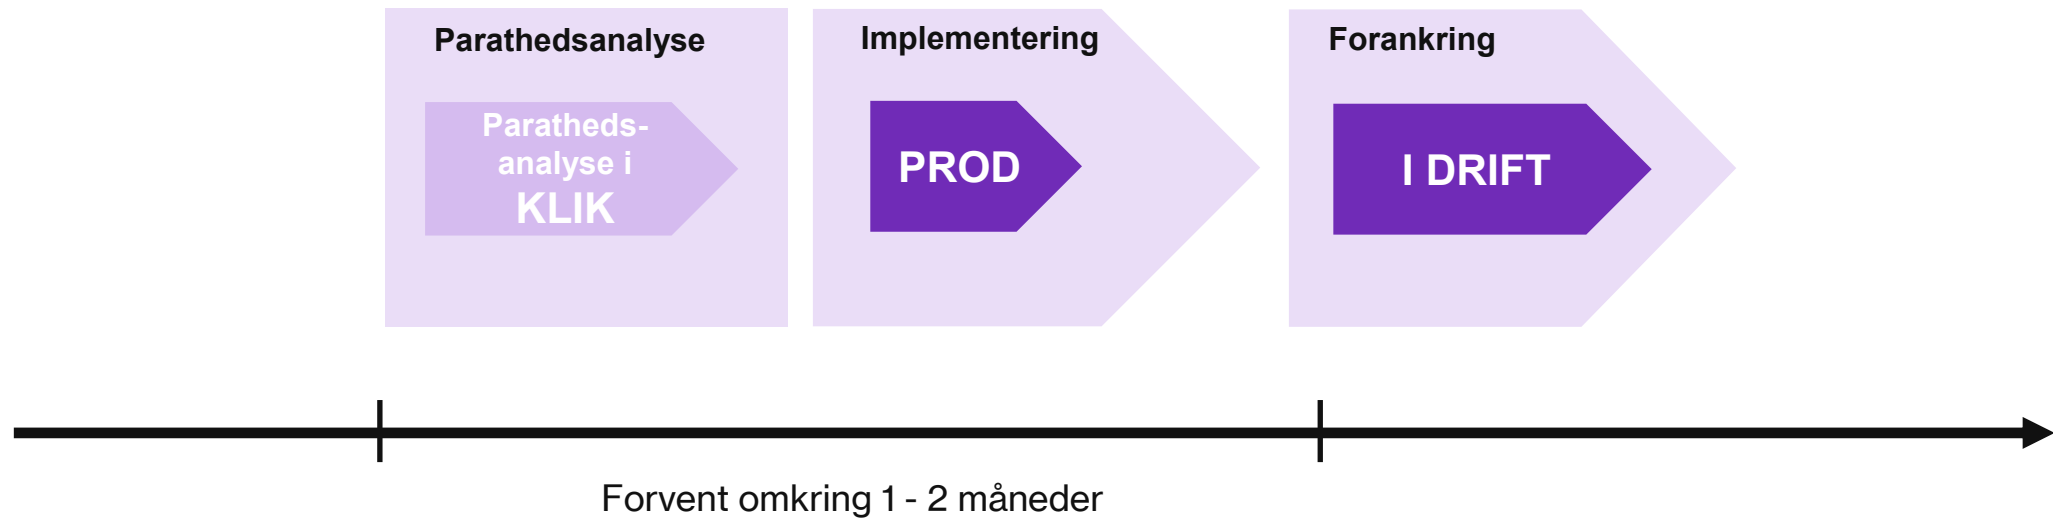

Tidsplan foldet ud på faser



Udfoldet tidsplan for "Light selvimplementering"



Alle opgaver relateret til testmiljøet udgår

IN-02

IN-04

IN-05

IN-06

IN-07

IN-08

FT-01

FT-02

FT-03

FT-04

FT-05




**Hvad kræver det af
organisering hos jer?**




Roller i projektet


**Meget
involveret**



SOR administrator




FK ORG
administrator



Projektleder


**Lidt
involveret**



KLIK
administrato
r



Aftaleadministrator



Rolleadministrator



KLIK opgaver – oversigt



Faser	Præfix i KLIK opgave	Opgave eksempel
Parathedsanalyse	PA	PA - xx
Forberedelse af infrastruktur	IN	IN - xx
Forberedelse til FK OSS test	FT	FT - xx
Forberedelse til Produktion	FP	FP - xx
Produktion	PR	PR - xx



KLIK-opgaver - oversigt

23 KLIK-opgaver i alt

- 1 KLIK-opgave: PA-00 Parathedsanalysen
- 22 KLIK-opgaver, som udføres, hvis I beslutter at fortsætte Udrulningsforløbet.

Ingen opfølgning på opgaverne

Alle opgaver har de samme start- og slutdatoer

	< Opgavetitel
1	PA-00-Gennemfør Parathedsanalyse for FK OSS - Selvimplementering
2	IN-01-Tildel rollen OSS Administrator til kommunens SOR administrator(er) - Selvimplementering
3	IN-02-Aktivering af kommunen i OSS i det eksterne testmiljø - Selvimplementering
4	IN-03-Aktivering af kommunen i OSS i produktionsmiljøet - Selvimplementering
5	IN-04-Verificer at kommunens Identity Provider (IdP) er korrekt tilsluttet Context Handler 2 i det eksterne testmiljø
6	IN-05-Opret og tildel jobfunktionsrolle til brugerne af Fælleskommunalt Organisations Synkroniserings System i p
7	IN-06-Anskaf og håndtér testcertifikat til Fælleskommunal Organisations Synkroniserings System (OSS) - Selvimpl
8	IN-07-Godkende serviceaftale til at hente data fra Fælleskommunal Organisationssystem (ORG) og Fælleskomm
9	IN-08-Godkende serviceaftale til rediger i Fælleskommunalt Organisationssystem (ORG) i testmiljøet - Selvimple
10	IN-09-Godkende serviceaftale til at hente data fra Fælleskommunalt Organisationssystem (ORG) og Fælleskomm
11	IN-10-Godkende serviceaftale til rediger i Fælleskommunalt Organisations System (ORG) i produktionsmiljøet - Se
12	IN-11-Opret og tildel jobfunktionsrolle til brugerne af Fælleskommunalt Organisations Synkroniserings System i p
13	IN-12-Anskaf og håndtér produktionscertifikat til Fælleskommunal Organisations Synkroniserings System (OSS) -
14	FT-01-Opret OSS testorganisation i SOR Demo - Selbimplementering
15	FT-02-Opret OSS testorganisation i ORG - Selvimplementering
16	FT-03-Blacklist de organisationsenheder i Fælleskommunalt Organisationssystem som ikke ønskes synkroniseret
17	FT-04-Sæt synkronisering i gang i Fælleskommunalt Organisations Synkroniserings Systems testmiljø - Selvimple
18	FT-05-Gennemfør Opgavesæt til afprøvning af opgaveløsning i OSS - Selvimplementering
19	FP-01-Sikre at enheder i FK ORG er opdateret på baggrund af PA-00-Parathedsanalyse for FK OSS - Selvimplem
20	FP-02-Blacklist de organisationsenheder i Fælleskommunalt Organisationssystem, som ikke ønskes synkronisere
21	FP-03-Sæt synkronisering i gang i Fælleskommunalt Organisations Synkroniserings Systems produktionsmiljø - S
22	PR-01-Forbind organisationsenheder - Selvimplementering
23	PR-02-Tildel rollen Systemansvarlig for OSS - Selvimplementering

